


Inspectieformulier installatie - ELC

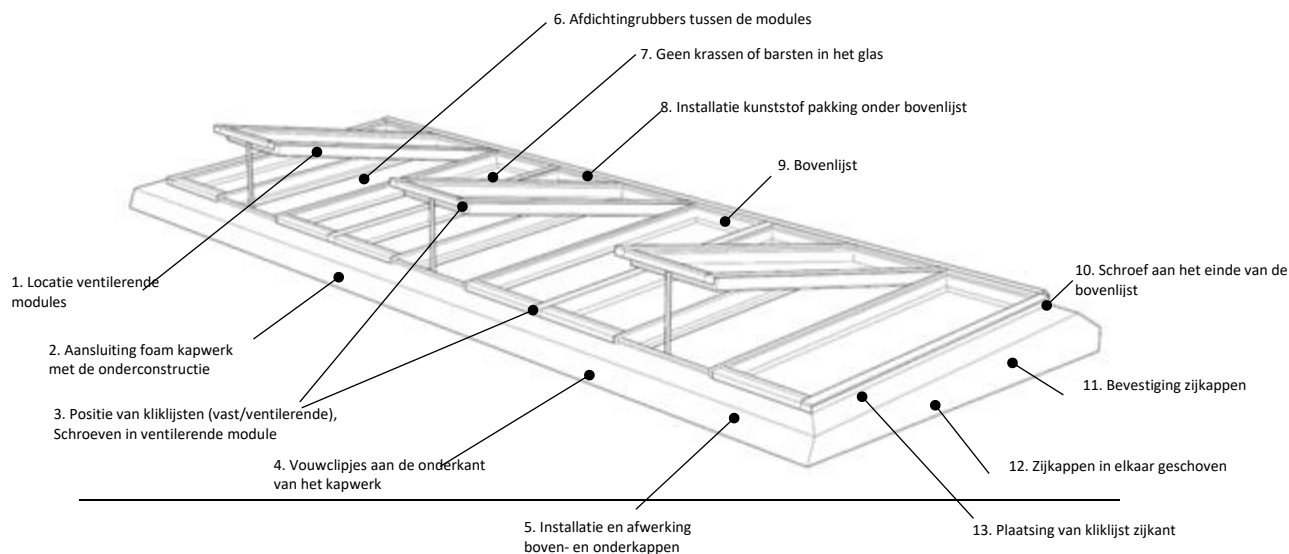

Project naam:		Project nr:		Lichtstraat aanduiding:	
Onderdeel:					
Nr:	Controle punten:	Controle ratio:	Controle methode:	Opmerkingen:	
1.	Locatie ventilerende modules	100 %	Visueel		
2.	Aansluiting foam kapwerk met de onderconstructie	100 %	Manueel		
3.	Positie van kliklijsten (vast/ventilerende), Schroeven in ventilerende module	100 %	Visueel		
4.	Vouwclipjes aan de onderkant van het kapwerk	100 %	Visueel		
5.	Installatie en afwerking boven- en onderkappen	100 %	Visueel		
6.	Afdichtingrubbers tussen de modules (vanaf onderkant controleren)	100 %	Visueel		
7.	Geen krassen of barsten in het glas	100 %	Visueel		
8.	Installatie kunststof pakking onder bovenlijst	100 %	Visueel		
9.	Bovenlijst	100 %	Visueel		
10.	Schroef aan het einde van de bovenlijst	100 %	Visueel		
11.	Bevestiging zijkappen	100 %	Visueel		
12.	Zijkappen in elkaar geschoven	100 %	Visueel		
13.	Plaatsing van kliklijst zijkant	100 %	Visueel		
14.	Elektrische componenten	100 %	Getest		

Datum:	Inspectie uitgevoerd door:
--------	----------------------------
